



Rijkswaterstaat Informatie  
Factsheet behorende bij Publicatie Inkoopplanning Maart 2022


# Integrale uitbesteding projectbegeleiding realisatie 3e tranche KRW

Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31168154

## DISCLAIMER

*Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of plannen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.*

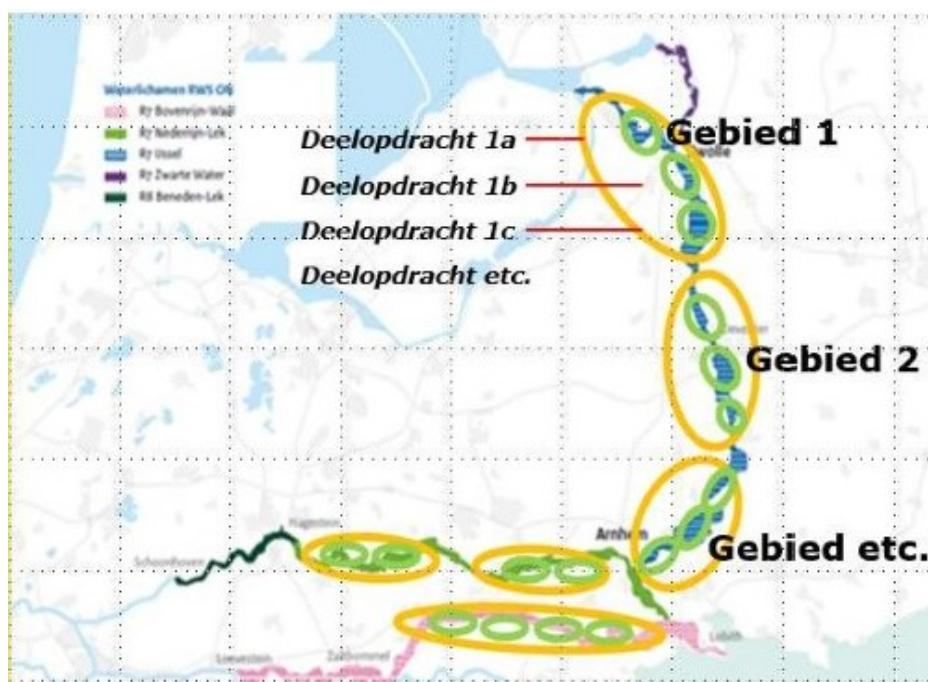



## Inhoud

1. Scope/locatie .....	3
2. Omvang Project.....	3
3. Technische disciplines .....	3
4. Eventuele specials .....	3
5. Planning aanbesteding en uitvoering .....	4
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	4
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering .....	4
8. BPKV-criteria.....	4
9. Risico's en risicoverdeling .....	4
10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie .....	4
11. Overige gerelateerde inkopen.....	5
12. Link naar projectwebsite.....	5



## 1. Scope/locatie

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de verplichting om KRW-maatregelen te treffen om voor 2027 de waterkwaliteit te verbeteren. Voor een deel van dit programma (het restant van tranche 2 en tranche 3) wordt momenteel een planstudie uitgevoerd. In de tabel is een overzicht opgenomen van de maatregelen, overigens kunnen deze waarden gedurende de planstudie nog wijzigen op basis van voortschrijdend inzicht.

In onderstaande tabel worden de locaties weergegeven:

Totaal	Geul (km)	Strang (km)	Beekmonding (km)	Uiterwaardverlaging (ha)	Oever (km)	Rivierhout*
Waal	9,3	1,0	0,0	68,0	0,0	ja
NRL	0,0	2,2	0,4	7,0	9,2	ja
IJssel	10,7	6,1	10,5	23,6	30,0	ja
Getijde Lek	0,0	0,0	0,0	0,3	3,0	ja
<b>Totaal</b>	<b>20,0</b>	<b>9,3</b>	<b>10,9</b>	<b>98,9</b>	<b>42,2</b>	<b>ja</b>

\* maximaal te plaatsen t.b.v. ecologische meerwaarden

Op dit moment wordt een planstudie uitgevoerd. De planstudie wordt door ingenieursbureaucombinatie Green Rivers Open Wonders (GROW) uitgevoerd, conform het gedachtegoed DOEN. Zij levert een aanbestedingsdossier op waarmee de markt kan worden benaderd, onder verantwoordelijkheid van RWS.

De scope van deze uitvraag heeft betrekking op de begeleiding van de realisatie. De inkoop leidt ertoe dat de markt zowel de aanbesteding, de uitvoeringsbegeleiding als de overdracht naar district gaat verzorgen voor RWS. Het uitgangspunt moet zijn dat met een beperkt aantal RWS-ers een groot aantal projecten kan worden uitgevoerd.

## 2. Omvang Project

Met het aanbesteden van de realisatie-opgaven, het beheersen van de realisatiecontracten en de overdracht naar de beheerder gaat naar verwachting een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro excl. btw gepaard.

## 3. Technische disciplines

100% ingenieursdiensten (projectmanagement)

## 4. Eventuele specials

Aanbestedingsprocedure Concurrentiegerichte dialoog Light.



## 5. Planning aanbesteding en uitvoering

Mijlpalen	Start
Goedkeuren aanbestedingsdocumenten IUD	30-9-2021
Start aanbesteding IUD/publicatie TenderNed (duur inclusief selectie: 6-8 maanden)	1-10-2021
Goedkeuren gunningsbeslissing IUD	1-7-2022

## 6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

De beoogde contractvorm is een dienstencontract o.b.v. ARVODI, de aanbestedingsprocedure de concurrentiegerichte dialoog light (Europese niet-openbare aanbesteding). De looptijd wordt momenteel geschat op 6 á 7 jaar, waarbij de realisatieprojecten gefaseerd gereedkomen.

## 7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Nog nader te bepalen.

## 8. BPKV-criteria

**Op moment van schrijven zijn er twee EMVI-BPKV-criteria geformuleerd:**

- 1) Mitigeren vertraging
- 2) Optimale Samenwerking.

## 9. Risico's en risicoverdeling

Nog nader te bepalen.

## 10. Mate ontwerprijheid en ruimte innovatie

Contractbegeleiding waarbij invulling nader te bepalen is door de markt.



## **11. Overige gerelateerde inkoop**

Dit betreft een secundaire inkoop.

## **12. Link naar projectwebsite**

Niet van toepassing.
